ABP #5

Proyecto: Rediseño del flujo de viáticos corporativos

Grupo Azul

PROJECT CHARTER

1. Información General:
Nombre del proyecto: Sistema Inteligente de Gestión de Viáticos
Líder del Proyecto:Equipo Grupo Azul- Product Owner
Fecha Inicio y Término: 4 semanas

2. Propósito y Justificación:
Problema:
- 5.400 solicitudes/año, con 20 días promedio reembolso
- 12% error, 8% boletas incompletas
- Falta de trazabilidad.y visibilidad.

Solución: Sistema digital con:
- Carga móvil, OCR para boletas
- Reglas automáticas de validación y flujo de aprobación inteligente
- Dashboard financiero en tiempo real con notificaciones proactivas.

Justificación (por qué ahora):
Estrategia 2026 exige eficiencia + transformación digital. Esta solución impacta clima laboral, eficiencia operativa y financiera.
Existen tecnologías para resolverlo, ya existe una mala experiencia de los colaboradores tanto del área operaciones como de finanzas.

3. SMART del Proyecto:
S: Implementar sistema digital inteligente de gestión de viáticos, que mejore tanto la experiencia de usuario como la visibilidad financiera.
M: Reducir error 12% → 2%, ciclo 20 → 5 días, SUS 40% →>=70%
Adopción del sistema →90%, reducción de consultas → 90%.
A: Tecnología SaaS + desarrollo ágil en 4 semanas
R: Impacta eficiencia, experiencia y digitalización. Mejora clima laboral.
T: Implementado en 30 días calendario REVISAR

4. Alcance:
Incluye:
- App móvil para android y IOS.
- Carga móvil boletas con OCR.
- Reglas automáticas por rol para validación automática.
- Tracking en tiempo real + notificaciones push.
- Dashboard financiero
- Modo Offline.

No Incluye Integraciones con ERP, convenios con proveedores, ni políticas para incentivos de ahorro en viáticos.

Entregables:
- Prototipo funcional
- Flujo digital completo
- Dashboard ejecutivo
- Manual de uso

5. Beneficios, KPIs y Criterios de Éxito
Beneficios Cuantitativos y KPI
- Reducción error de un 12% a menos de un 2%.
- Ahorro ≈ $2.430.000 año (270 horas de analista).
- Reducción de ciclo de 20 a 5 días.
- Reducción de consultas en 90%
- Reducción estimada dedicación analistas 30% ahorro = $10.800.000

Beneficios Cualitativos
- Mayor transparencia
- Mejor clima y menor estrés financiero

Criterios de Éxito:
- 90% de solicitudes realizadas de forma digital
- 70% de las solicitudes aprobadas de forma automática
- OCR completando el 80% de los campos.

6. Restricciones:
- Tiempo: Implementación rápida (MVP 4 semanas)
- Presupuesto:
- Recursos/Capacidad: Baja conectividad en rutas. Usuarios resistentes al uso de nuevas TI.
- Tecnología/Herramientas:Movil android gama baja, Google OCR, Prototipo APP.
- Legal/Compliance: Respaldos tributarios válidos (boletas), políticas internas de gastos.

7. Cronograma (máximo 4 hitos)
- H1: Diseño prototipo flujo digital completo
- H2: Validación con colaboradores y jefaturas
- H3: Implementación MVP con OCR + aprobación automática
- H4: Lanzamiento oficial + dashboard operativo

8. Top 5 Riesgos (Probabilidad/Impacto/mitigación)
- Resistencia al cambio – Alta/Alta – Mitigación: capacitación + change management
- Conectividad en terreno – Media/Alta – Mitigación: modo offline
- Curva de aprendizaje – Media/Media – Mitigación: UX simple + onboarding
- Integración ERP futura – Media/Media – Mitigación: fase 2 con API
- OCR falla con boletas ilegibles – Media/Alta – Mitigación: edición manual + validaciones

9. Presupuesto
Monto:
- Proyecto de bajo costo (MVP sin integraciones complejas).

Recursos:
- UX / Service Design
- Desarrollo móvil
- Motor reglas negocio
- Finanzas (validación)
- TI

Licencias/Herramientas:
- Google Vision OCR
- MarvelApp
- Infraestructura cloud básica

10. Calidad y Criterios de Aceptación
Definición de calidad:
- Proceso completo en ≤5 días
- Error <2%
- Aprobación automática ≥70%
- Tracking con latencia <5 min
- Experiencia SUS ≥70

Criterios de aceptación global:
- Usuario registra gasto en <30 segundos
- 0 consultas de estado
- Dashboard actualizado en tiempo real
- Reducción comprobable de reprocesos
- Alta adopción sin retorno a Excel

HISTORIAS DE USUARIO (HU), TAREAS, WSJF

Épica	Historia de Usuario	Tarea	WSJF	Scrum Recomendado	Sprint Recomendado
Registro de Gastos	Como conductor quiero tomar una foto de la boleta para registrar el gasto sin ingresar datos manualmente	Diseñar pantalla cámara	5.2	Scrum 1	Sprint 1
		Integrar cámara móvil	5.2	Scrum 1	Sprint 1
		Guardar imagen	5.2	Scrum 1	Sprint 1
		Asociar a solicitud	5.2	Scrum 1	Sprint 1
		Validar formato imagen	5.2	Scrum 1	Sprint 1
	Como conductor quiero que el sistema complete automáticamente monto, fecha y proveedor para ahorrar tiempo y reducir errores	Integrar OCR	3.4	Scrum 1	Sprint 3
		Mapear campos clave	3.4	Scrum 1	Sprint 3
		Validar lectura	3.4	Scrum 1	Sprint 3
		Mostrar preview editable	3.4	Scrum 1	Sprint 3
		Guardar datos estructurados	3.4	Scrum 1	Sprint 3
	Como conductor quiero editar los datos detectados por OCR para corregir errores si la lectura no es correcta	Habilitar edición campos	3.8	Scrum 1	Sprint 2
		Validación de formato	3.8	Scrum 1	Sprint 2
		Confirmación usuario	3.8	Scrum 1	Sprint 2
		Guardado definitivo	3.8	Scrum 1	Sprint 2
		Log de cambios	3.8	Scrum 1	Sprint 2
Validación y Políticas	Como sistema quiero validar automáticamente los gastos según política para reducir revisiones manuales	Definir reglas validación	3.6	Scrum 1	Sprint 3
		Motor de reglas	3.6	Scrum 1	Sprint 3
		Validación automática	3.6	Scrum 1	Sprint 3
		Clasificar aprobado/excepción	3.6	Scrum 1	Sprint 3
		Registro auditoría	3.6	Scrum 1	Sprint 3
Aprobación	Como jefe quiero aprobar o rechazar gastos desde el móvil para agilizar decisiones	Crear vista aprobación	5.0	Scrum 1	Sprint 1
		Mostrar detalle gasto	5.0	Scrum 1	Sprint 1
		Botón aprobar/rechazar	5.0	Scrum 1	Sprint 1
		Registrar decisión	5.0	Scrum 1	Sprint 1
		Notificar resultado	5.0	Scrum 1	Sprint 1
Seguimiento	Como conductor quiero ver el estado de mi solicitud en tiempo real para no tener que preguntar	Diseñar timeline visual	4.2	Scrum 1	Sprint 2
		Actualizar estados backend	4.2	Scrum 1	Sprint 2
		Sincronización en tiempo real	4.2	Scrum 1	Sprint 2
		Mostrar fechas	4.2	Scrum 1	Sprint 2
		Historial estados	4.2	Scrum 1	Sprint 2
	Como conductor quiero recibir notificaciones cuando cambie el estado para estar informado	Configurar notificaciones push	3.6	Scrum 2	Sprint 5
		Definir eventos disparadores	3.6	Scrum 2	Sprint 5
		Integrar servicio push	3.6	Scrum 2	Sprint 5
		Permisos usuario	3.6	Scrum 2	Sprint 5
		Test notificaciones	3.6	Scrum 2	Sprint 5
Registro de Gastos	Como conductor quiero registrar un gasto sin conexión para poder usar la app en zonas rurales	Implementar almacenamiento local	1.8	Scrum 2	Sprint 8
		Detectar estado conexión	1.8	Scrum 2	Sprint 8
		Sincronización automática	1.8	Scrum 2	Sprint 8
		Manejo de conflictos	1.8	Scrum 2	Sprint 8
		Pruebas offline	1.8	Scrum 2	Sprint 8
Validación y Políticas	Como conductor quiero ver cuánto he gastado vs mi límite permitido para no exceder el tope	Configurar reglas de negocio	2.8	Scrum 2	Sprint 6
		Calcular acumulado	2.8	Scrum 2	Sprint 6
		Mostrar barra de progreso	2.8	Scrum 2	Sprint 6
		Alertas visuales	2.8	Scrum 2	Sprint 6
		Bloqueo si excede	2.8	Scrum 2	Sprint 6
Reportes y Control	Como finanzas quiero ver un dashboard con métricas de viáticos para controlar tiempos y errores	Definir KPIs	2.1	Scrum 2	Sprint 7
		Construir dashboard	2.1	Scrum 2	Sprint 7
		Conectar base datos	2.1	Scrum 2	Sprint 7
		Visualizar métricas clave	2.1	Scrum 2	Sprint 7
		Validar datos	2.1	Scrum 2	Sprint 7

PRESUPUESTO

Evaluación Financiera – Proyecto Rediseño de Viáticos

El proyecto considera una inversión Capex de $40.000.000 CLP y un Opex de $3.000.000 CLP.
Actualmente el proceso de viáticos implica un costo administrativo mensual de $3.000.000 (2 analistas) y presenta una tasa de error del 12%, generando retrabajo y 120 tickets mensuales.

Con la implementación de la solución se proyecta:

Reducción del 30% del costo administrativo → ahorro mensual de $900.000.

Disminución del retrabajo (8% de 5.400 solicitudes anuales) → ahorro estimado mensual de $540.000.

Beneficio mensual estimado total: $1.440.000.

En un escenario conservador el payback es de 27,7 meses.
Sin embargo, considerando crecimiento operacional y la no contratación de un tercer analista (ahorro adicional de $1.500.000 mensual), el beneficio mensual asciende a $2.940.000.

En este escenario:

Payback estimado: 13,6 meses (cumple meta ≤ 18 meses).

ROI proyectado a 24 meses: 76%.

Se recomienda la Opción 3 – Automatización Inteligente, ya que equilibra inversión y retorno, reduce errores estructurales y alinea el proyecto con la estrategia 2026 de eficiencia operativa y transformación digital.

Concepto	Monto CLP
Capex	$40.000.000
Opex	$3.000.000
Costo administrativo actual mensual	$3.000.000
Ahorro 30% costo administrativo	$900.000
Ahorro mensual por retrabajo	$540.000
Beneficio mensual conservador	$1.440.000
Payback conservador (meses)	27,7
analista	$1.500.000
Beneficio mensual optimizado	$2.940.000
Payback optimizado (meses)	13,6
Beneficio anual optimizado	$35.280.000
ROI proyectado a 24 meses (%)	76

Carga de trabajo del equipo
Supervisa la capacidad de tu equipo. Reasignar actividades para obtener el equilibrio adecuado
Persona asignada
Distribución del trabajo
Claudia Gonzalez
81%
Carlos Salinas
Christian rubilar
Tiare Segura Mejías
Valeska García

Progreso de Epic
Comprueba cómo están progresando tus epics de un vistazo. Ver todos los epics
Finalizado
En progreso
Por hacer
GA-6 REGISTRO DE GASTOS
60%
40%
GA-9 Validación y políticas
100%
GA-29 Reportes y Control
100%

Desglose de prioridad
Obtén una visión global de cómo se prioriza la actividad. Cómo gestionar las prioridades de los espacios
40
20
0
Highest
High
Medium
Low
Lowest
Ninguna

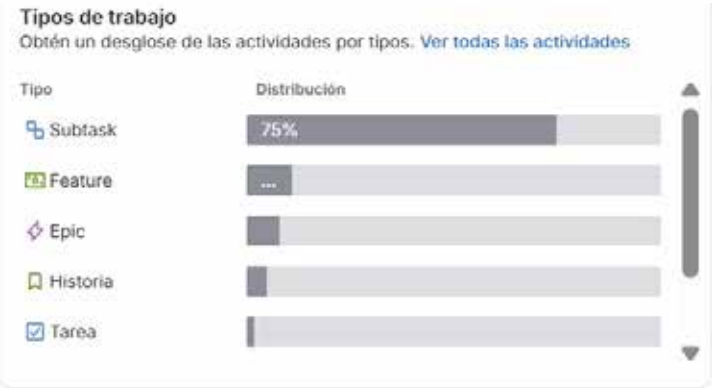
Tipos de trabajo
Obtén un desglose de las actividades por tipos. Ver todas las actividades
Tipo
Distribución
Subtask
75%
Feature
Epic
Historia
Tarea

Resumen de estado
Obtén una instantánea del estado de tus actividades. Ver todas las actividades
63
Actividades en ...
To Do: 1
Idea: 60
In progress: 1
Blocked: 1

Mi gestión de proyectos

Resumen | Backlog | Tablero | Calendario | Cronograma | Páginas | Formularios | Lista | Informes

Buscar en el ba... | Filtro

SCRUM Sprint 01 10 feb - 31 mar (3 actividades) | Completar sprint

Desarrollar parte 1 del sistema que facilite la captura de boletos de gastos mediante OCR

- GA-3 HU 1 — REGISTRO DE GASTOS — BLOQUEADO — 27 feb
- GA-36 HU 5 — AUDITORÍA — IDEA
- GA-2 Tarea 2 — REGISTRO DE GASTOS — TAREA POR HACER — 28 feb

+ Crear

SCRUM Sprint 02 Añadir fechas (3 actividades) | Iniciar sprint

- GA-31 HU 3 — REGISTRO DE GASTOS — IDEA
- GA-42 HU 6 — DESCONOCIMIENTO — IDEA

+ Crear

2 de 2 actividades visibles | Estimación 0 de 0

SCRUM Sprint 3 Añadir fechas (2 actividades) | Iniciar sprint

- GA-6 HU 2 — REGISTRO DE GASTOS — EN CURSO — 15 mar
- GA-10 HU 4 — VALIDACIÓN Y POLÍT... — IDEA

+ Crear

2 de 2 actividades visibles | Estimación 0 de 0

SCRUM Sprint 4 Añadir fechas (1 actividad) | Iniciar sprint

- GA-47 HU 7 — REGISTRO DE GASTOS — IDEA

+ Crear

1 de 1 actividad visible | Estimación 0 de 0

SCRUM Sprint 5 Añadir fechas (2 actividades) | Iniciar sprint

- GA-53 HU 8 — VALIDACIÓN Y POLÍT... — IDEA
- GA-55 HU 9 — IDEA

+ Crear

2 de 2 actividades visibles | Estimación 0 de 0

SCRUM Sprint 6 Añadir fechas (1 actividad) | Iniciar sprint

- GA-59 HU 10 — REPORTES Y CONTROL — IDEA

+ Crear

Resumen | Backlog | Tablero | Calendario | Cronograma | Páginas | Formularios | Lista | Informes +

Buscar tablero | CG CS | Filtro

GA-6 REGISTRO DE GASTOS (2 actividades) IDEA

IDEA	IN PROGRESS	TO DO 1	BLOCKED 1	DONE
+ Crear		Tarea 2 28 feb 2026 GA-2 10 CS	HU 1 27 feb 2026 GA-3 9 CG	

GA-27 Aprobación (1 actividad) IDEA

IDEA 1	IN PROGRESS	TO DO	BLOCKED	DONE
HU 5 GA-36 CG + Crear				

Resumen | Backlog | Tablero | Calendario | Cronograma | Páginas | Formularios | Lista | Informes +

Buscar en el crono... | CG CS TM VG CR | Epic | Tipo | Categoría de es...

Actividad	Feb / Mar											Mar							Mar							Mar	
	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Sprints	SCRUM Sprint 01																										
GA-6 REGISTRO DE GASTOS																											
GA-9 Validación y políticas																											
GA-27 Aprobación																											
GA-28 Seguimiento																											
GA-29 Reportes y Control																											
+ Crear Epic																											

Mi gestión de proyectos

Resumen | Backlog | Tablero | Calendario | Cronograma | Páginas | Formularios | Lista | Informes

Ask AI | Buscar actividad | Filtro

Actividad	Persona asignada	Informador	Prioridad	Estado	Resoluci
GA-65 HU 9	Claudia Gonzalez	Claudia Gonzalez	Medium	IDEA	Sin reso
GA-29 Reportes y Control	Claudia Gonzalez	Carlos Salinas	Medium	IDEA	Sin reso
GA-28 Seguimiento	Carlos Salinas	Claudia Gonzalez	Medium	IDEA	Sin reso
GA-27 Aprobación	Tiare Segura Mejías	Claudia Gonzalez	Medium	IDEA	Sin reso
GA-9 Validación y políticas	Claudia Gonzalez	Claudia Gonzalez	Medium	IDEA	Sin reso
GA-6 REGISTRO DE GASTOS	Christian rubilar	Claudia Gonzalez	Medium	IDEA	Sin reso

+ Crear

6 de 6
