Evaluación del módulo 7

Consigna del proyecto

Proyecto: Alineamiento de Iniciativas Ágiles para Desarrollo de Producto

Evaluación del módulo 7: AGILE INCEPTION

Contexto EdTech antes 2026 📍
Nace el 2021 con una propuesta clara: Ofrecer experiencias de aprendizaje digital más personalizadas, dinámicas y medibles para estudiantes de Enseñanza Media. Durante los primeros años se posiciono en colegios particulares subvencionados y algunos particulares a través de 3 fortalezas:

- Biblioteca de recursos digitales alineados al currículum.
- Plataforma de evaluaciones formativas con feedback automático.
- ~~Motor de recomendaciones de contenidos según desempeño del estudi~~ante.

Entre el 2022 y 2024 se consolidaron en el mercado validando su propuesta pedagógica. Sin embargo, a medida que crecían comenzó a aumentar la complejidad operativa.

En 2025:
Ventas 2024 : $905MM (+18%)
Ventas 2025 : $1,104MM (+22%)
Costos operacionales : $772MM (70%)
Saldo bruto : $331MM.
Otros gastos : $298MM
Margen Op Real : 3% ($33MM)
Margen Op Esperado : 8% ($88MM) <>$55MM.

En el 2025 lo que salió bien:

- Se aumentó un 18% su base de clientes institucionales.
- Se logró un 80% de satisfacción en encuestas docente sobre del módulo evaluaciones.
- Se logró un 88% de satisfacción general de la comunidad escolar.

En el 2025 lo que no salió bien:

- **Experiencia digital fragmentada.** Hubo 4 entornos y más de 3 accesos, obligando a pasar por demasiados pasos para ingresar y encontrar contenidos. Consecuencias: el tiempo promedio para búsqueda de recursos era superior a 15 minutos, el 42% de usuarios abandonaba la navegación, y las encuestas cayeron del 81% al 68%.

alkemy

- **Baja adopción en estudiantes.** El problema estuvo en la continuidad. Consecuencias: Solo el 38% de estudiantes se mantuvo activo desde el primer mes, y el 22% utilizo la plataforma de forma recurrente al menos 2 veces por semana.
- **Fracaso parcial de la Biblioteca Inteligente.** Se falló en el desarrollo e implementación de las "Rutas Smart", pensando en recomendar recursos educativos. El problema no fue la idea, sino su aterrizaje: seguía todo fragmentado. Consecuencia: Se invirtió $72MM entre diseño, equipo, desarrollo, contenidos y pilotaje. Solo el 27% interactúo más de una vez. El 18% de los docentes declaró que las recomendaciones eran útiles. El 54% de usuarios pilotos reportó navegación poco intuitiva o confusa.

Por lo tanto, hubo sobrecarga operativa, las prioridades no estaban alineadas, hubo desarrollo sin una visión compartida y bajo la performance del equipo.

Balance 2025
La sensación fue mixta. Sé logro crecer, validar la propuesta pedagógica y fortalecer la reputación. Pero, se comprobó que el ecosistema digital estaba fragmentado, que todo el contenido estaba disperso y que la experiencia debe ser más simple, integrada y priorizada.

Objetivos EdTech 2026:
- Crecer el Margen Operacional en un 20%.
- Llegar al 30% de clientes institucionales.
- Seguir fortaleciendo la Transformación Digital y Experiencia del Usuario.

Unidad Solicitante: Área de Innovación y Producto de EdTech.
El equipo de Innovación debe iniciar el proyecto para crear una plataforma que centralice recursos educativos digitales personalizados para estudiantes de enseñanza media. EdTech desea alinear al equipo multidisciplinario (negocio, tecnología, diseño y pedagogía) antes de iniciar el desarrollo formal. Para ello, solicitaron la implementación de Agile Inception que permita definir el propósito del proyecto, acordar un MVP tentativo y establecer el plan de arranque. El equipo ya cuenta con todos los participantes clave y el proyecto aún no inició.

Objetivo para el Proyecto desde EdTech 📋
Diseñar una plataforma centralizada que permita a estudiantes y docentes acceder, descubrir, organizar y utilizar recursos educativos digitales personalizados desde una experiencia única, clara y progresiva.
- Centralizar al menos el 85% de la experiencia digital de aprendizaje. Reduciendo a 1 punto el acceso y disminuyendo en 40% el tiempo de búsqueda de contenidos.
- Aumentar en 30% recurrencia del uso estudiantil. Logrando que al menos

el 65% de estudiantes utilice la plataforma 3 veces por semana al cierre del 2026.
- Mejorar en un 50% la experiencia de docentes en la búsqueda, asignación y seguimiento de recursos. Elevando a 95% la satisfacción docente.
- Aprovechar los activos pedagógicos ya desarrollados en al menos un 75%.
- Tomar decisiones 100% basadas en los flujos críticos, usabilidad y entrega de valor.

Restricciones y Tensiones del Proyecto 📋
- EdTech no quiere repetir el error 2025.
- Presión comercial por mostrar avances en segundo trimestre 2026.
- Los colegios quieren profundidad curricular.

A qué los desafío como docente 📋
- Que la propuesta este alineada a los objetivos EdTech 2026 y Objetivos del Proyecto.
- Que el pasado no es adorno, sino insumo de decisiones.
- Que el problema no es "crear más contenido".
- Que el nuevo MVP no debe intentar resolver todo.
- Que el Story Mapping, **aunque será básico**, refleja una lógica incremental de valor.
- **Que el Deck no es solo completar con frases genéricas como "mejorar experiencia", digitalizar el proceso" o "ser más eficientes". Sino que como equipo PO sean capaz de pensar, analizar y proyectar la iniciativa estratégicamente.**
- Que no todo se puede resolver en la V1, será necesario priorizar el valor real.
- Que, como Equipo PO, nuevamente dejen de Hacer y pasen a Ser. En otras palabras, que demuestren como conectan el producto con el negocio. (Dato: Esto último se debe ver reflejado y justificado en el resumen ejecutivo).

Y, por último:
1.- No comiencen pensando en la solución, comiencen pensando en el problema y en el negocio.
2.- Lleven este Inception a un escenario lo más realista posible. De esta manera, cuando el proyecto pasa a Scrum, lo hace con bases sólidas.

Les dejo estas preguntas iniciales que les ayudará al análisis y primeras respuestas:
¿Qué errores, fracasos o tensiones no deberíamos repetir?
¿Qué fortalezas y/o capacidades instaladas sí conviene aprovechar?
¿Qué o cuáles objetivos 2026 hacen urgente esta iniciativa?
¿Qué parte de la Entrega de Valor (incremento) deberíamos entregar

primero?
¿Qué dejaríamos para una segunda versión?

Paso a paso 👣
Este proyecto se refiere exclusivamente al módulo AGILE INCEPTION, las cuales podrás avanzar de forma progresiva y escalonada con la ayuda de los manuales teóricos y los contenidos desarrollados en las clases en vivo.

A continuación, encontrarás las tareas a desarrollar:

1.- Agile Inception Deck
Link compartido de Figma en el cual deberán insertar el resumen final del proyecto a través de los 10 componentes.

En este documento Word insertar:
- Pantallazo desde Figma del Deck.



Pasar de una experiencia fragmentada a una experiencia continua y simple

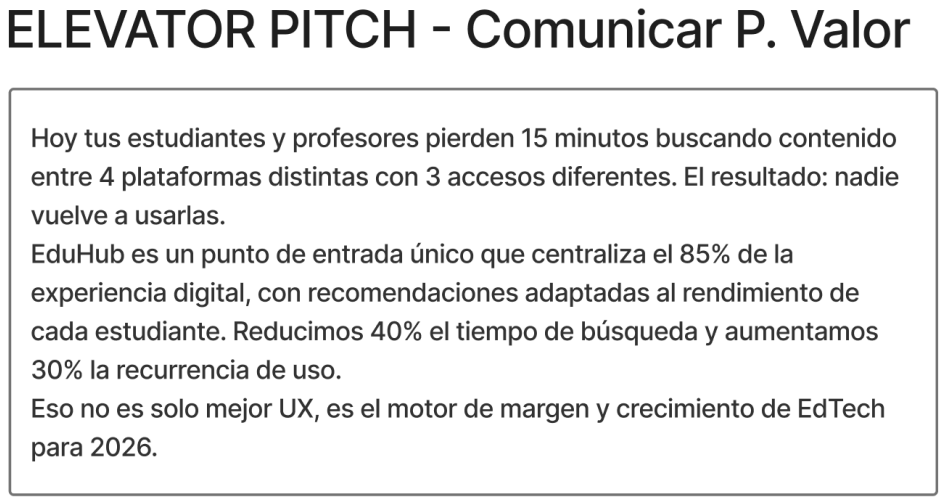

Product Box - Propiedades del producto

- **Acceso único (login centralizado)**
- **Home personalizada**
- **Buscador simple e intuitivo**
- **Recomendaciones básicas**
- **Asignación de contenidos (docentes)**
- **Seguimiento básico de uso**

Not List - Alcance

Es más fácil decir que cosas no estarán, a decir que cosas estarán.

ALCANCE

- Login único
- Home centralizada
- Buscador básico
- Visualización de contenidos
- Asignación simple

FUERA ALCANCE

- Personalización avanzada
- IA compleja
- Automatizaciones avanzadas
- Analítica avanzada

SIN RESOLVER / NO se va a considerar

- Integración total con sistemas legacy
- Calidad de recomendaciones futuras
- Escalabilidad técnica

Mis vecinos - Relacionamiento

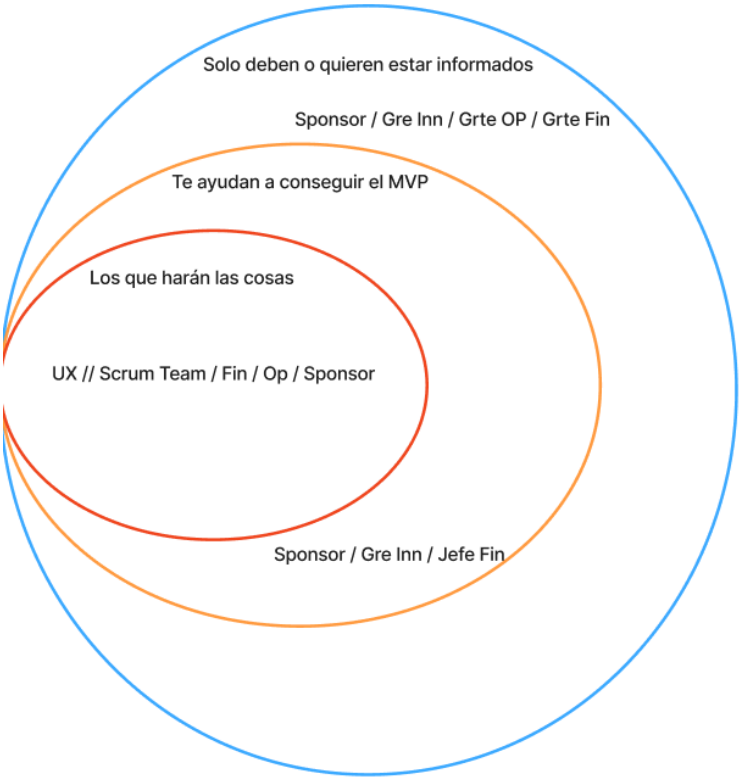

V1: Negocios/Tecnología / UX/UI / Pedagogía
V2: Marketing / Ventas / Customer Service.
V3: Colegios / Docentes / Estudiantes

Mostrar la Solución - Cómo debería ser

- Se muestra una aproximación de lo que será el MVP.
- Se deciden Altos Costos y Bajos Costos. Baja Fidealidad.

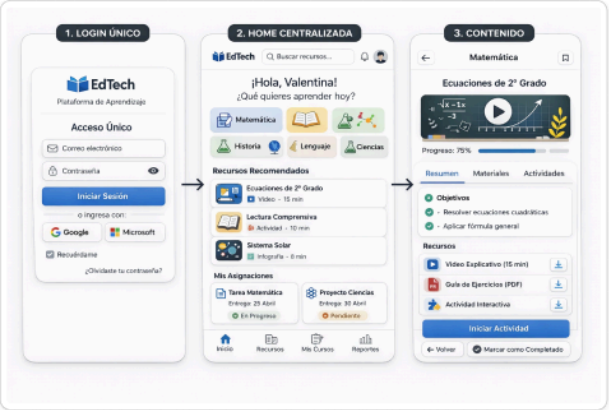

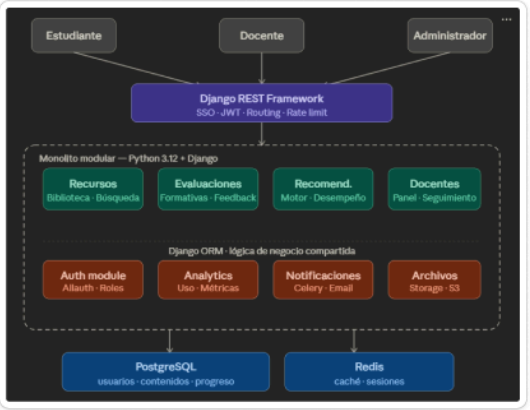

- Frontend — React + TypeScript para la SPA, Tailwind para UI responsive y React Query para el manejo de llamadas a la API con caché del lado del cliente.
- Backend — Python 3.12 como lenguaje base, Django como framework del monolito modular, Django REST Framework para exponer la API JSON, y Celery para tareas asíncronas como notificaciones o generación de reportes.
- Auth — SSO con OAuth 2.0 para el acceso único, JWT para sesiones stateless, y Django Allauth para la gestión de roles (estudiante, docente, admin).
- Datos — PostgreSQL como base principal, Redis para caché y sesiones, Django ORM para modelos y migraciones, y almacenamiento en S3/Cloud para los archivos de recursos educativos.
- Infra — Docker para contenedores, GitHub Actions para CI/CD, Nginx como reverse proxy, y Sentry para monitoreo de errores en producción.

Cuánto Proyectamos dar

¿Cuánto proyectamos dar para el MVP > Tamaño en tiempo.

Categoría	MES 1 - A	MES 1 - A	MES 2 - B	MES 2 - B	MES 3 - C	MES 3 - C
Acceso y Navegación	Login único	Home unificada	Mejora navegación	Búsqueda optimizada	Navegación fluida	Personalización básica
Contenidos	Acceso a biblioteca central	Visualización recursos	Filtros por asignatura	Recomendaciones simples	Organización contenidos	Sugerencias por uso
Experiencia Usuario	Flujo simple y claro	Reducción de pasos	Feedback usuario	Mejora usabilidad	Experiencia más intuitiva	Ajustes de experiencia
Docentes	Búsqueda de recursos	Asignación básica	Seguimiento simple	Gestión de actividades	Mejora asignación	Organización clases
Estudiantes	Acceso a contenidos	Consumo de recursos	Continuidad de uso	Recordatorios	Mayor engagement	Uso recurrente

¿Qué no te deja dormir? - Riesgos

EVITAR

👉 Errores que YA ocurrieron en 2025 y que explican el fracaso parcial

- Volver a una experiencia fragmentada (más de 1 acceso / múltiples entornos)
- Desarrollar soluciones sin integración (como pasó con Rutas Smart)
- Construir funcionalidades sin validar flujos reales de uso

Desalineación entre negocio, tecnología y pedagogía

💡 Conexión directa con el caso:

Esto fue lo que generó:

- 42% abandono
- 15 min de búsqueda
- Caída en satisfacción

👉 Si esto se repite → el proyecto vuelve a fallar aunque crezca en ventas

MITIGAR

👉 Riesgos críticos para cumplir objetivos 2026

- Integración de sistemas actuales (ecosistema fragmentado 2025)
- Baja adopción estudiantil (solo 22% uso frecuente hoy)
- Recomendaciones poco útiles (solo 18% docentes las valoraron)
- UX confusa (54% usuarios piloto lo reportaron)

🎯 Acciones concretas (clave PO):

- Validación continua con usuarios reales (docentes y estudiantes)
- Priorización de flujos críticos (no features)
- MVP centrado en integración antes que inteligencia

👉 Conecta directo con objetivo:

- ↑ recurrencia 65%
- ↓ tiempo búsqueda 40%

PREOCUPARSE

👉 Tensiones reales del negocio

- Presión comercial por mostrar resultados en Q2 2026
- Expectativa de profundidad curricular por parte de colegios
- Brecha entre crecimiento comercial y capacidad operativa
- Riesgo de que el MVP no cumpla expectativas iniciales

💡 Insight:

En 2025 crecieron, pero el producto no acompañó → eso no puede volver a pasar

ACEPTAR

👉 Decisiones estratégicas conscientes del MVP

- No resolver toda la personalización en V1 (evitar error Rutas Smart)
- No incluir analítica avanzada en etapa inicial
- Experiencia inicial no perfecta, pero sí integrada
- Uso de recomendaciones básicas (no sofisticadas)

💡 Decisión clave PO:

"Primero integración y uso real, después sofisticación"

Balance - Que vamos a dar.

Una característica por ítem.

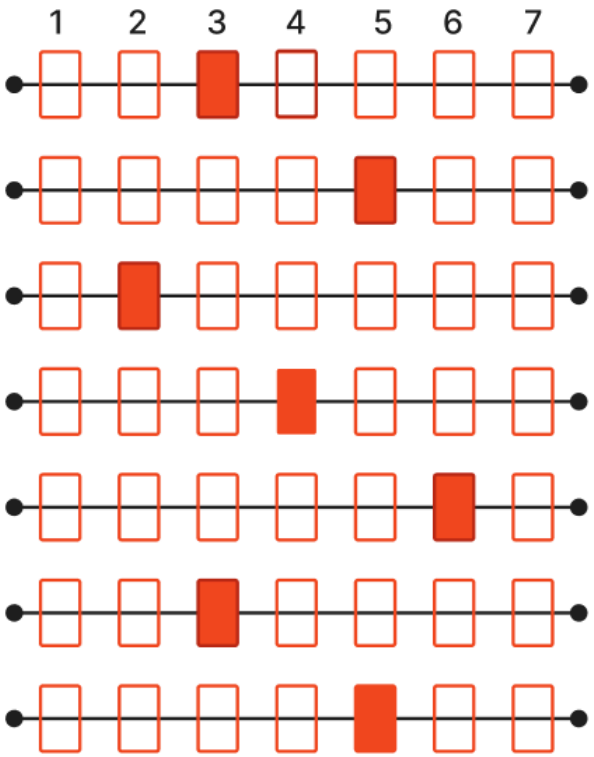

Alcance
MVP focalizado: centralización + recomendaciones básicas. No se resuelve todo.

Presupuesto
Controlado pero suficiente. Se aprendió de los $72MM perdidos en 2025.

Estándar de Calidad
UX funcional y sin errores críticos. No se busca perfección visual en V1.

Tiempo
3 meses para MVP. Presión de Q2 obliga a entregar valor visible rápido.

Interacción
Alta prioridad: la experiencia de navegación es el problema central a resolver.

Amigable > ¿Qué sea que?
Interfaz clara y simple. No compleja. Diseño guiado por usabilidad, no por estética.

Escalable > ¿Qué sea que?
Arquitectura que permita crecer a V2 sin reescribir. Inversión inteligente desde el inicio.

¿Cuánto va costar?

¿Qué se recomienda tener? > Apoyarse con los Vecinos

PO	SM	Dev	Externo (UX/QA)	Pedagogo / Contenidos	Data Analyst
$2,5MM	$ 1,5MM	$1,3MM	$1MM	$0,8MM	$0,7MM

Si trae personas de otras Gerencias > ¿Centro Costo?

¿Cuánto será el costo el tiempo?

Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4
Arquitectura + SSO + Integración biblioteca $4,5MM	Motor recomendaciones + Panel docente $5MM	Piloto + iteración UX + métricas $4MM	Ajustes post-piloto + escalamiento Q3 $3,5MM

- Resumen Ejecutivo en el que expliquen y justifiquen las principales decisiones

como Equipo PO. **Evidenciar cómo conectan el producto con el negocio, problema y valor entregado.** Máximo media plana. Utilicen pocas palabras y mayor apoyo visual. Claridad, síntesis y coherencia de la propuesta.

R:

Resumen Ejecutivo: Conexión Producto-Negocio

Diagnóstico Estratégico El 2025 dejó una lección clara: el crecimiento en ventas (+22%) no se tradujo en rentabilidad debido a una **experiencia digital fragmentada** (4 entornos distintos) que causó un abandono del 42% de los usuarios. No falló la pedagogía, falló la entrega del valor.

La Propuesta de Valor Nuestra decisión como Equipo PO es dejar de "crear contenido" para pasar a **"centralizar la experiencia"**. El foco del MVP no es la cantidad de recursos, sino la **eficiencia del flujo**:

- **Negocio:** Buscamos recuperar el margen operacional del 8% (actualmente 3%) mediante la reducción de la sobrecarga operativa y la retención de clientes.
- **Problema:** Eliminamos los "más de 3 accesos" para consolidar un **punto único de entrada** que reduzca el tiempo de búsqueda en un 40%.
- **Valor:** El éxito se medirá en la **recurrencia** (pasar del 22% al 65% de uso activo), transformando la plataforma de un repositorio estático a un hábito educativo semanal.

Justificación de Prioridades Hemos decidido priorizar el **acceso único y la organización de activos existentes (75%)** antes que nuevas funcionalidades de IA o "Rutas Smart" complejas. Primero debemos estabilizar la base de usuarios para asegurar el cumplimiento del hito del segundo trimestre de 2026.

2.- Story Mapping. Cómo equipo PO deben entender cómo el usuario utiliza y/o utilizará el producto en un flujo real.

Proceso 1: Acceso y Descubrimiento Centralizado

- **Nombre Actividad 1:** Autenticación Unificada (Single Sign-On).
  - **Lanzamiento 1 (MVP):** Acceso único para docentes y estudiantes vinculando las bases de datos actuales de los 4 entornos previos.
  - **Lanzamiento 2:** Integración con sistemas de gestión escolar externos (Interoperabilidad PIE).
- **Nombre Actividad 2:** Buscador Inteligente de Recursos.
  - **Lanzamiento 1 (MVP):** Filtro por asignatura y nivel utilizando el 75% de los activos pedagógicos ya disponibles.

    - **Lanzamiento 2:** Motor de búsqueda predictivo basado en etiquetas de desempeño histórico.
- **Nombre Actividad 3:** Dashboard de Inicio (Home Único).
    - **Lanzamiento 1 (MVP):** Visualización de los últimos recursos utilizados y tareas pendientes en una sola pantalla.
    - **Lanzamiento 2:** Notificaciones personalizadas sobre nuevas recomendaciones de contenido.

Proceso 2: Gestión y Seguimiento Pedagógico

- **Nombre Actividad 1:** Asignación de Recursos (Docente).
    - **Lanzamiento 1 (MVP):** Panel para que el docente seleccione un recurso y lo asigna directamente a su curso con un click.
    - **Lanzamiento 2:** Programación de rutas de aprendizaje personalizadas por grupos de nivel.
- **Nombre Actividad 2:** Visualización de Progreso (Estudiante).
    - **Lanzamiento 1 (MVP):** Barra de progreso simple y feedback automático de evaluaciones formativas.
    - **Lanzamiento 2:** Gamificación y logros para incentivar el uso 3 veces por semana.

Portafolio 💼

Este proyecto puede ser incluido en tu portafolio profesional como una simulación completa de planificación inicial ágil. Asegúrate de presentar el material con una introducción breve del caso, las herramientas utilizadas y tu rol dentro de la propuesta. Te recomendamos destacar especialmente tu capacidad de facilitación, pensamiento estratégico y conocimiento de metodologías ágiles para proyectos digitales.
